



Instructions Mission 4



«Le rétroplanning presque parfait»

Narratif en gras

Le calendrier est serré. La ville veut voir les travaux avancer. Mais le réemploi bouscule les plannings classiques. Votre mission : créer un rétroplanning intelligent, prenant en compte les déposes, transports, conditionnements... pour ne pas mettre en péril le chantier.

Le Réseau de la Construction Circulaire (R2C) vous a confié une mission, en deux phases :

- 1. Comprendre comment le réemploi peut s'intégrer dans un planning de chantier classique**
- 2. Comprendre qui sont les acteurs d'un chantier de réemploi**
- 3. Faire face aux aléas**

Enigme 1 – Les étapes du planning


Les études du projet arrivent à terme et il n'y a toujours pas de planning de chantier auquel se référer! Vous êtes l'équipe qui y remédiera!

Prenez en main les cartes «Actions» bleues et remettez-les dans l'ordre afin de créer un planning d'actions.

Certaines cartes peuvent se passer en même temps et seront donc placées sur la même colonne.

Pour vous aider à placer les cartes dans l'ordre, vous pouvez vous aider des cartes vertes.

SOLUTIONS

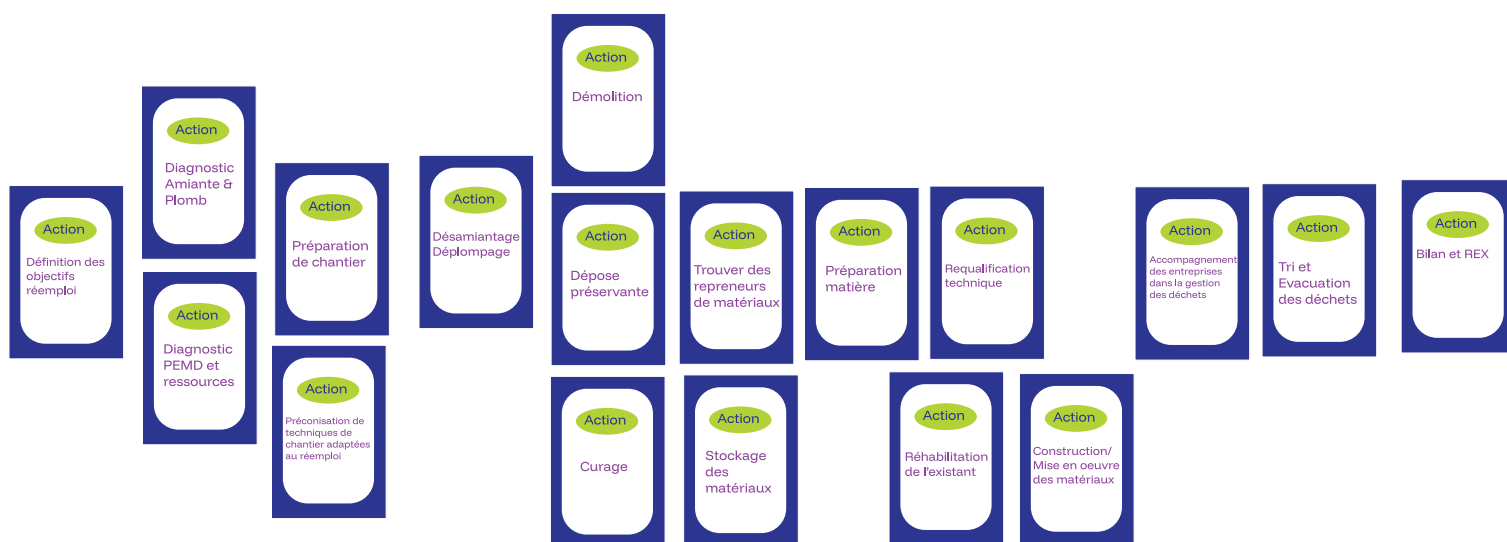

Énigme 2 : Connaître les acteur.ices d'un chantier intégrant du réemploi

Maintenant que le planning est complété, il faut désormais répartir les tâches entre les acteur.ices du chantier.

Celleux-ci sont divisés ici en trois catégories: la maîtrise d'ouvrage (le client/commanditaire), la maîtrise d'oeuvre et les entreprises de travaux ainsi que le bureau d'étude réemploi et les acteur.ices de l'économie circulaire.

Chaque groupe a une enveloppe contenant des clés d'une couleur qui leur est associé.

Déposez les clés sur chaque carte «Actions» du planning fait précédemment afin de répartir chaque tâche à l'acteur.ice concerné.e. Chaque action peut concerner plusieurs groupes d'acteur.ices.

SOLUTIONS:

Action Diagnostic Amiante & Plomb  	Action Diagnostic PEMD et ressources  	Action Désamiantage Déplombage 	Action Préparation de chantier   	Action Démolition 
Action Curage  	Action Dépose préservante  	Action Trouver des repreneurs de matériaux  	Action Stockage des matériaux   	Action Préparation matière 
Action Bilan & Retours d'expériences   	Action Requalification technique 	Action Construction/ Mise en oeuvre des matériaux   	Action Evacuation des déchets   	Action Réhabilitation de l'existant  
Action Définition des objectifs réemploi   	Action Préconisation de techniques de chantier adaptées au réemploi 	Action Accompagnement des entreprises dans la gestion des déchets  		

Énigme 3 : Faire face aux aléas

Grâce à vous, le chantier a pu commencer!

Cependant, qui dit chantier dit aléas! Il vous faut vite trouver des solutions!

Pour cela, prenez les cartes «Aléas» et choisissez, pour chaque carte, la bonne solution.

Notez bien vos réponses car celles-ci vous aideront, à l'aide de la carte «Code», à trouver le mot clé qui vous permettra de lever le frein «temporel»!

SOLUTIONS:

Code à trouver: 2-4-9-10-14

Mot à trouver: ANTICIPATION
